

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2020 ZASADY OCENIANIA

Układ graficzny © CKE 2019

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Oznaczenie arkusza: EE.08-02-20.01-SG

Oznaczenie kwalifikacji: EE.08

Numer zadania: **02** Wersja arkusza: **SG**

> PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

	Wypełnia egzaminator												
Kod ośrodka		Numer PESEL zdającego*							Numer stanowisk				
Kod egzaminatora													
Data egzaminu Dzień Miesiąc Rok						_	_	_	_				
Godzina rozpoczęcia egzaminu :						+	+	+	+				

^{*} w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

	5
\vec{c}	.2
Ĕ	tanow
Ź	Ĕ
	÷

ska			
stanowisk			
sta			

Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1. Wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń

Uwaga! Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 ÷ 1.6), test przeprowadza zdający w obecności egzaminatora. Kryteria 1.7 ÷ 1.9 należy ocenić po zakończeniu egzaminu. Przebieg należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1.

** 1	onga 1.							
1	Wszystkie żyły kabla podłączono do styków modułu keystone według sekwencji T568A							
2	Przewody podłączone do styków modułu keystone nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm							
3	Poprawnie zmontowano gniazdo sieciowe z jednym modułem keystone							
4	Wtyczkę RJ45 zaciśnięto poprawnie – zatrzask jest na koszulce							
5	Wtyczkę RJ45 zaciśnięto zgodnie z sekwencją T568A							
6	Przeprowadzono test połączenia gniazdo – wtyczka za pomocą testera, który wykazał poprawność wykonania (test wykonuje zdający)							
7	Serwer podłączono do portu LAN rutera							
8	Serwer podłączono do gniazda LAN sali egzaminacyjnej							
9	Stację roboczą podłączono do portu WAN rutera							

r ska			
Numer stanowiska			
Sta			

Rezultat 2. Zmontowai	y i skonfigurowany serwer	oraz stacia robocza
-----------------------	---------------------------	---------------------

Uwaga! Sprawdzenie parametrów SMART należy wykonać dla serwera w systemie Linux, hasło konta root to ZAQ!2wsx
Plik SMART znajduje się na stacji roboczej na pulpicie konta lokalnego Administrator (hasło: ZAQ!2wsx)
Dopuszcza się możliwość podania przez zdającego zapisu N/A lub innego równoważnego świadczącego o braku informacji. W takim przypadku również uznajemy to kryterium, jeżeli jest zgodne ze zrzutem ekranowym zawartymi w pliku HDD na koncie root serwera.

1	W stacji roboczej zamontowany dysk oznaczony jako Windows oraz pamięć oznaczona jako RAM2			
2	Zamontowano dysk twardy z systemem Linux Serwer			
3	Założono partycję o możliwie maksymalnym rozmiarze i sformatowano z systemem ext4			
4	Utworzoną partycję trwale podmontowano pod katalog /mnt/dysk2			
5	Zapisano w pliku SMART wartość parametru 01 z nazwą Raw_Read_Error_Rate oraz zapis jest zgodny ze stanem faktycznym			
6	Zapisano w pliku SMART wartość parametru 05 z nazwą Reallocated_Sector_Ct oraz zapis jest zgodny ze stanem faktycznym			
7	Zapisano w pliku SMART wartość parametru 10 z nazwą Spin_Retry_Count oraz zapis jest zgodny ze stanem faktycznym			
8	Zapisano w pliku SMART wartość parametru 197 z nazwą Current_Pending_Sector oraz zapis jest zgodny ze stanem faktycznym			
9	Zapisano w pliku SMART wartość parametru 198 z nazwą Offline_Uncorrectable oraz zapis jest zgodny ze stanem faktycznym			
10	Zapisano w pliku SMART wartość parametru 199 z nazwą UDMA_CRC_Error_Count oraz zapis jest zgodny ze stanem faktycznym			

r ska			
Numer ınowiska			
Sta			

Rezultat 3. Skonfigurowane urządzenie sieciowe

Uwaga: sprawdzenie należy wykonać dla serwera w systemie Linux, hasło konta root to ZAQ!2wsx

Sprawdzenie należy wykonać dla stacji roboczej w systemie Windows, hasło konta Administrator to ZAQ!2wsx

Hasło do rutera przekaże asystent techniczny. Jeżeli ruter wymagał zmiany hasła, to hasło powinno zostać ustawione na ZAQ!2wsx


Na pulpicie konta Administrator znajduje się dokument o nazwie konfiguracja ruter ze zrzutami wykonanej konfiguracji rutera, który może posłużyć do sprawdzenia regultatu

rez	u						
1	W ruterze na interfejsie LAN ustawiono adres 10.10.10.1 z maską 255.255.255.0						
2	W ruterze wyłączono usługę DHCP						
3	W ruterze wyłączono sieć bezprzewodową						
4	W ruterze na interfejsie WAN ustawiono adres 88.88.88.1 z maską 255.255.255.252						
5	W ruterze na interfejsie WAN ustawiono bramę domyślną 88.88.88.2						
6	W ruterze na interfejsie WAN ustawiono serwer DNS 8.8.8.8						
7	W ruterze ustawiono przekierowanie portu 8080 interfejsu WAN na port 8080 serwera						

r ska			
Numer stanowisk			
sta			

Uw ora Po	zultat 4. Skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej vaga: sprawdzenie należy wykonać dla serwera w systemie Linux, hasło konta root to ZAQ!2wsx uz dla stacji roboczej w systemie Windows, hasło konta Administrator to ZAQ!2wsx informacji od przewodniczącego ZN o skonfigurowaniu interfejsów sieciowych należy ocenić komunikację pomiędzy urządzeniami - 4.10). Sprawdzenia komunikacji dokonuje zdający w obecności egzaminatora.	sie	сіоч	vymi	(k	ryte	ria:
1	Na serwerze pierwszy interfejs sieciowy ma ustawiony adres IP 10.10.10.2 z maską 255.255.255.0						
2	Na serwerze drugi interfejs sieciowy ma ustawiony adres IP 192.168.0.x z maską 255.255.255.0, gdzie x to numer stanowiska						
3	Serwer ma ustawioną bramę domyślną na 10.10.10.1						
4	Serwer ma ustawiony serwer DNS na 10.10.10.1						
5	Na stacji roboczej interfejs sieci przewodowej ma ustawiony adres IP 88.88.88.2 z maską 255.255.255.252						
6	Na stacji roboczej interfejs sieci przewodowej ma ustawioną bramę domyślną na adres IP 88.88.88.1						
7	Na stacji roboczej interfejs sieci przewodowej ma ustawiony serwer DNS na adres IP 8.8.8.8						
8	Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera z drukarką. Uzyskano odpowiedź dla polecenia ping 192.168.0.200						
9	Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera z ruterem. Uzyskano odpowiedź dla polecenia ping 10.10.10.1 lub 88.88.88.1						
10	Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera ze stacją roboczą. Uzyskano odpowiedź dla polecenia ping 88.88.88.2						

	Nur			\perp	
	sta sta				
Uи	zultat 5. Skonfigurowany serwer vaga: sprawdzenie należy wykonać dla serwera w systemie Linux, hasło konta root to ZAQ!2wsx rawdzenie należy wykonać dla stacji roboczej w systemie Windows, hasło konta Administrator to ZAQ!2wsx				
1	Ustawiono właściciela katalogu /www na www-data.www-data lub apache.apache				
2	Ustawiono prawa katalogu /www na 555				
3	Ustawiono właściciela pliku /www/index.html na www-data.www-data lub apache.apache				
4	Ustawiono prawa pliku /www/index.html na 444				
5	Ustawiono lokalizację katalogu domyślnej witryny Web na /www				
6	Domyślną witrynę HTTP powiązano z portem 8080				
7	Ze stacji roboczej dostępna jest opublikowana witryna pod adresem http://88.88.88.1				
Pr	zebieg 1. Przebieg wykonania okablowania sieciowego				
Zde	njący:				
1	przy wykonywaniu montażu okablowania sieciowego zdejmował izolację z kabla UTP stosując narzędzia do tego celu przeznaczone				
2	przy montażu kabla UTP do moduły keystone i wtyczki oraz montowaniu gniazda sieciowego stosował narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zasadami BHP				
3	po wykonaniu okablowania sieciowego uporządkował stanowisko egzaminacyjne				
Eg	zaminator		 	•••••	
	imię i nazwisko data i czytelny	poa	pis		

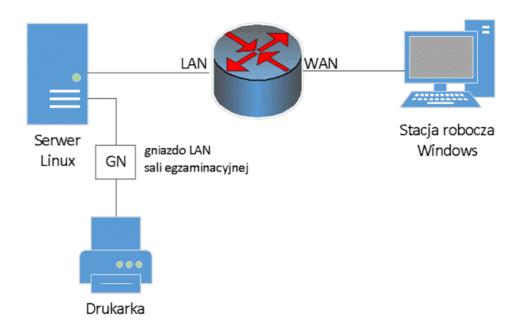

Schemat połączenia urządzeń sieciowych
